2023.6.29修正

工事番号　令和4年度債務管設3-001号
工事件名　仙台合同庁舎衛生設備改修工事

実施工程表

工期	着工 令和 5年 2月 3日	請負業者	株式会社　北陵建設	現場代理人	千葉　大介
	完成 令和 6年 3月 8日			監理技術者	千葉　大介

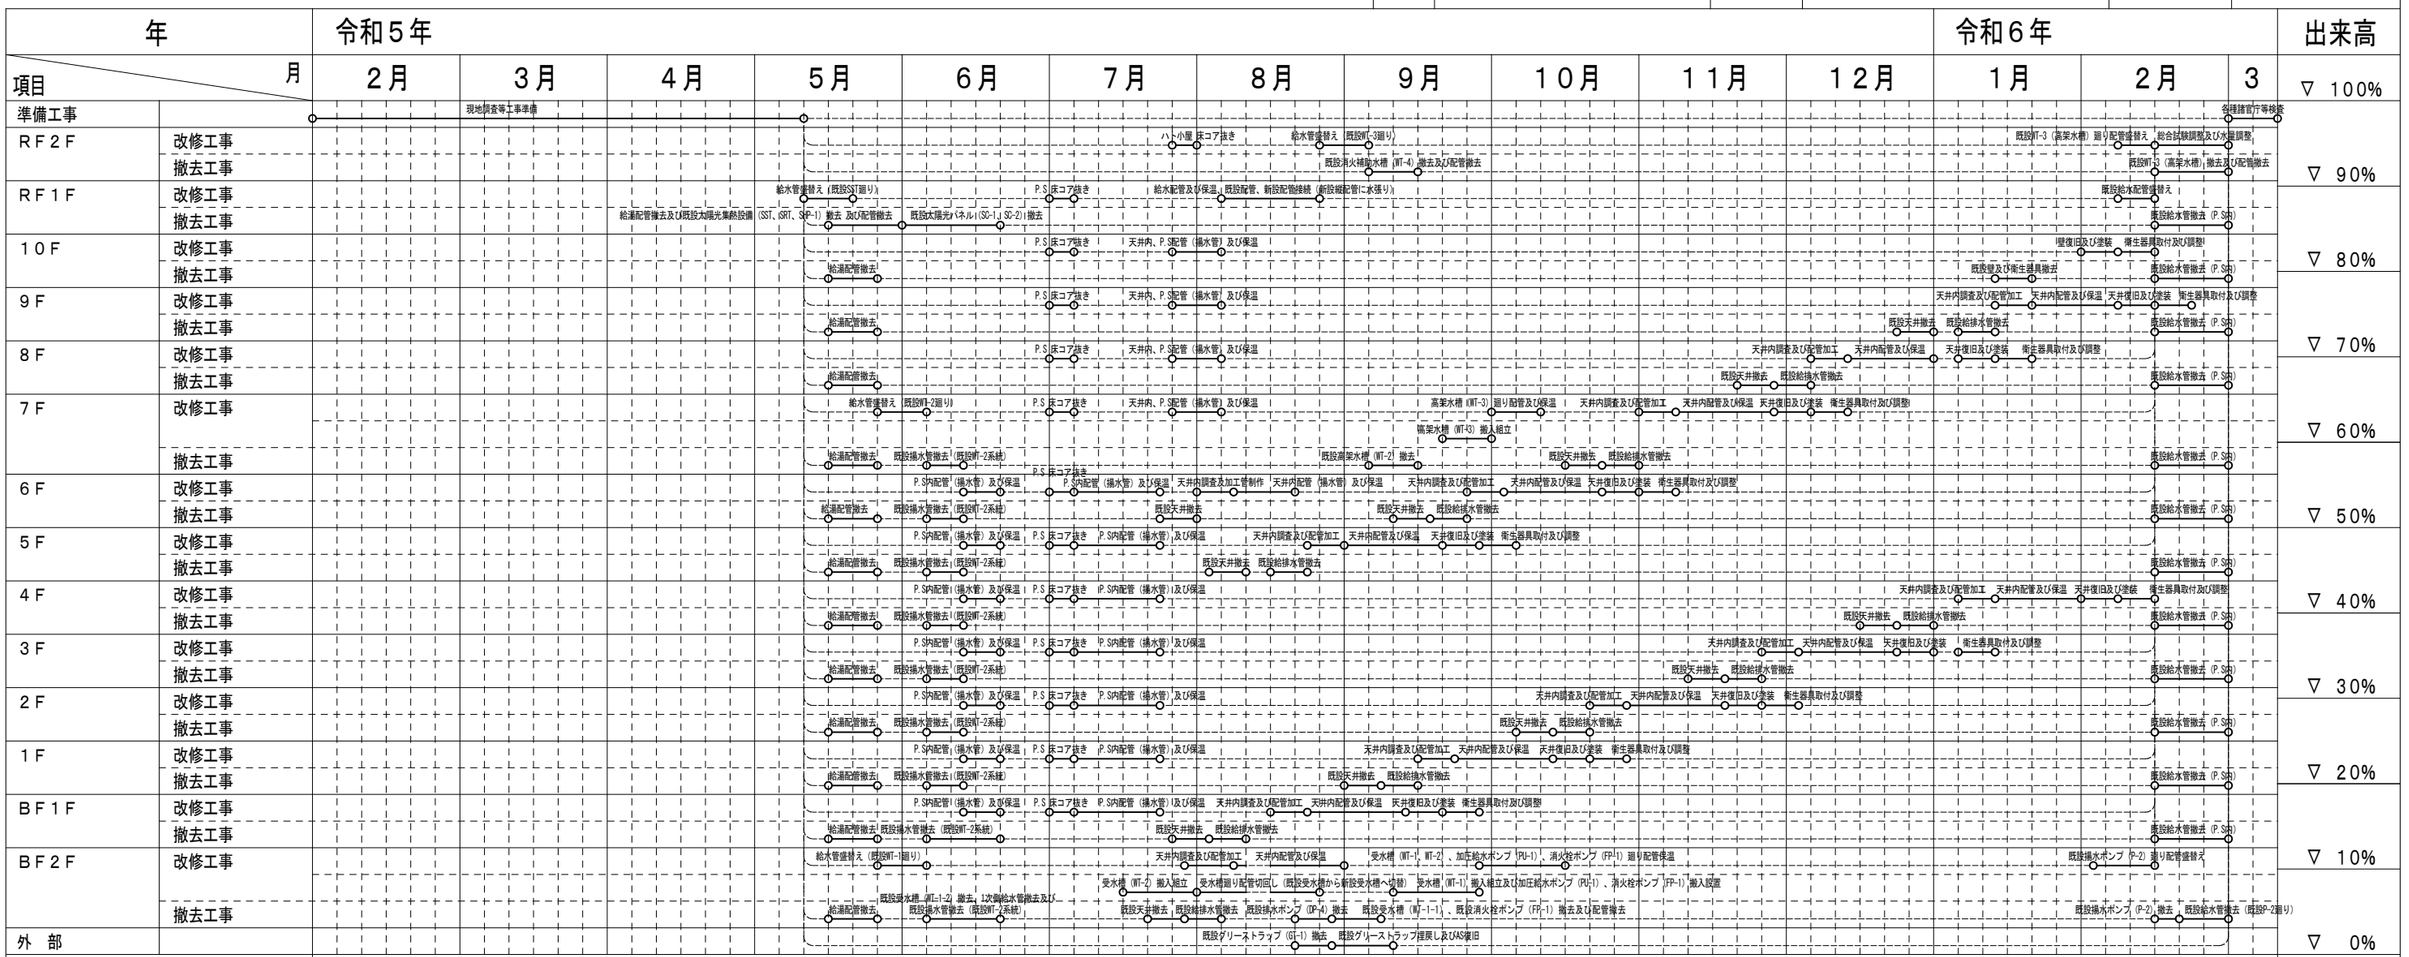

出来高 %	0%	0%	0%	0%	0.9%	6.1%	13.9%	25.6%	48.4%	62.0%	74.6%	81.9%	89.6%	98.6%	100%

主要機材搬入予定						▲ 受水槽（WT-2）		▲ 高架水槽（WT-3）、衛生器具（以降随時） ▲ 受水槽（WT-1） ▲ 加圧給水ポンプ（PU-1） ▲ 消火ポンプ（FP-1）							
承認事項・提出書類	契約関係書類	契約関係書類 施工計画書	施工計画書 施工図 納入仕様書	施工計画書 施工図 納入仕様書	施工図	施工図	施工図	施工図	施工図	施工図	施工図	施工図		完成図書	
工程内検査・各種検査			○					材料搬入、工程内検査（随時）						完成検査 ○	

| 安全管理目標 | | | | | | | | | | | | | | |
